

شماره :
تاریخ :
پیوست :

سرکار خانم عکرمه جباری سلام اسرار

امید

تاریخ: 404/01/26

شماره: 402/ب/207

معاونت محترم اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز جناب آقای مهندس اخلاقی
با سلام و احترام

پی ابلاغ از سازمان به اینجانب یلدا باقری به شن نظام مهندسی 3109102088 بنا به

درخواست متقاضی در زمینه ساخت گلخانه واقع در استان البرز با توجه به بازدید به عمل آمده در تاریخ 404/01/25

وضعیت ملک موجود متعلق به آقای عبدالحسین روغنیان واحد ساوجبلاغ چنار کوهسار پ 325 اصلی پس از بررسی

نقشه مبنی بر ارائه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه مراتب جهت اطلاع و اتخاذ تصمیمات مقتضی به شرح زیر حضورتان زیر اعلام می گردد.

پیشرفت فیزیکی از بابت میزان پیشرفت واحد فنی سازه گلخانه 0 صفر درصد بر آورد می گردد .

با تشکر

یلدا باقری

یلدا باقری

مهندسی یلدا باقری
کارشناس خدمات

بِسْمِہِ تَعَالٰی

شماره :

تاریخ :

پیسٹ :


عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به شماره: ۳۱۰۹۱۰۲۰۸۸

رتبه ممتاز خدمات مشاوره (فضای سبز)

صلاحیت : مشاور تولید - طراحی و امکان سنجی - نظارت بر اجرا، ساخت و تولید

تهیه طرح های توجیهی ، فنی و اقتصادی

پروانه اشتغال : الف/۲۲/۳۱/۱۳۹۸

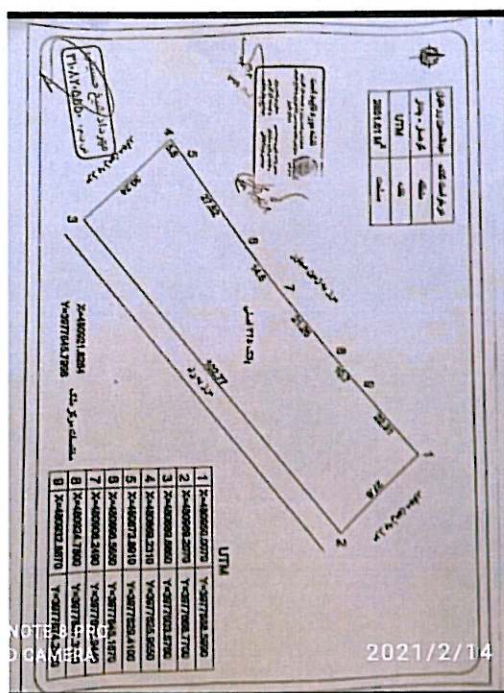
[illegible]

Untitled Map

Write a description for your map.

Legend

- ??? ???
- Feature 1
- Line Measure
- Line Measure
- Line Measure
- Untitled Polygon

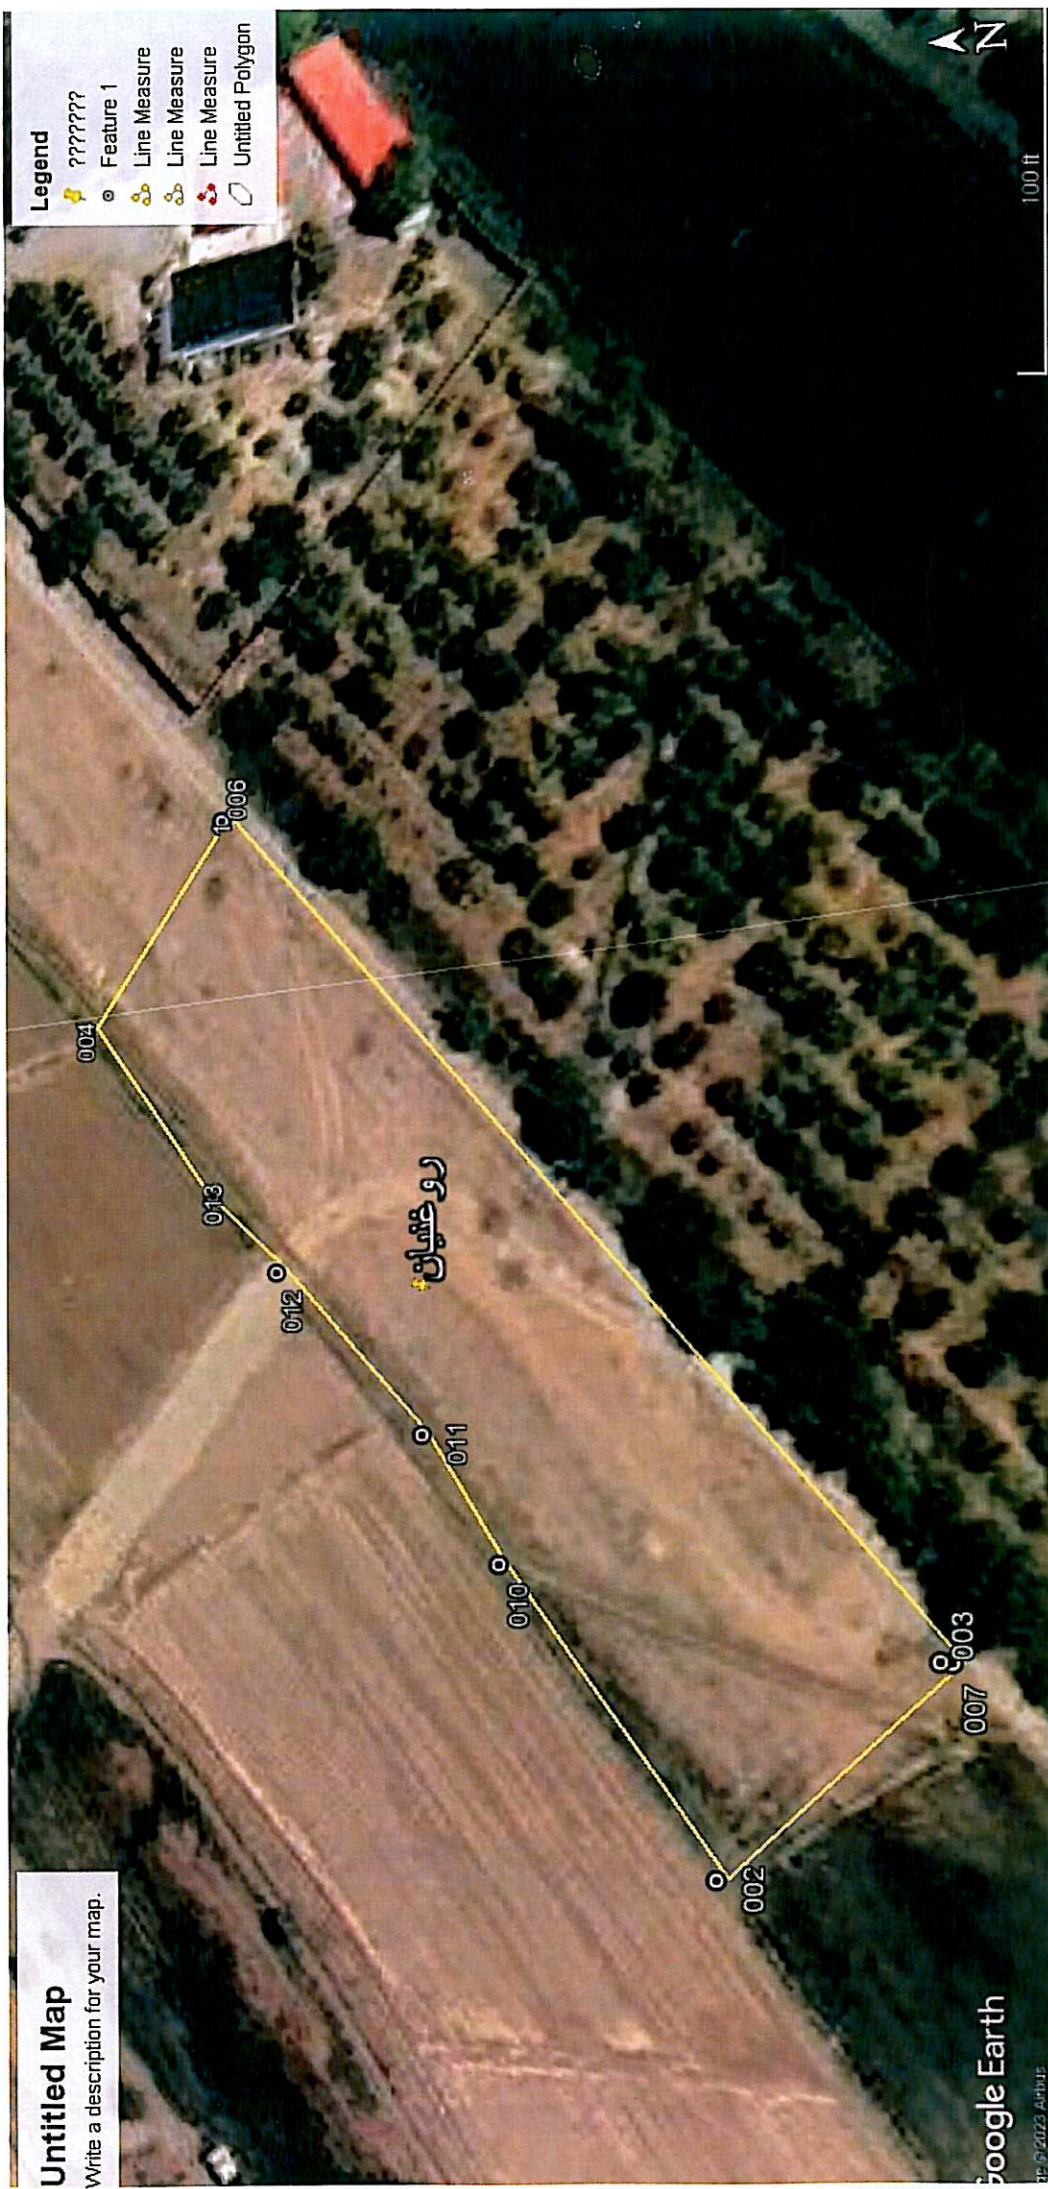

Google Earth

© 2023 Airbus

ردیف	نوع عملیات اجرایی	حد اکثر پیشرفت فیزیکی (درصد)	پیشرفت فیزیکی در وضع موجود (درصد)	ملاحظات
1	عملیات زیر بنایی و آماده سازی زمین (شامل تسطیح ، خاکبرداری ، محوطه سازی ، احداث جاده دسترسی ، نصب تابلو)	10	0	
2	خدمات زیر بنایی	5	0	
3	احداث ساختمان و ابنیه (سوله ، سالن ، انبار و) مطابق طرح مصوب و سایت پلان	35	0	
4	خرید ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	15	0	
5	استقرار و نصب ماشین آلات و وسائل مورد نیاز اجرای فعالیت	20	0	
6	ایجاد فضای سبز مشجر به میزان مندرج در طرح	5	0	
7	شروع بهره برداری	10	0	
	جمع	100	0	0

*ضروری است مجری طرح برابر مراحل فوق نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند .

پیشرفت فیزیکی فعلی معادل 0..... درصد می باشد

یلدا باقری

کارشناس بازدید کننده :

یلدا باقری

